


美濃戸高原別荘地


2021年4月19日 更新



令和6年度 水道施設大規模工事
(秋)

11月18日(月) ~ 試掘・準備作業
11月25日(月) ~ 本工事

A地点 12月2日 ~ 12月6日

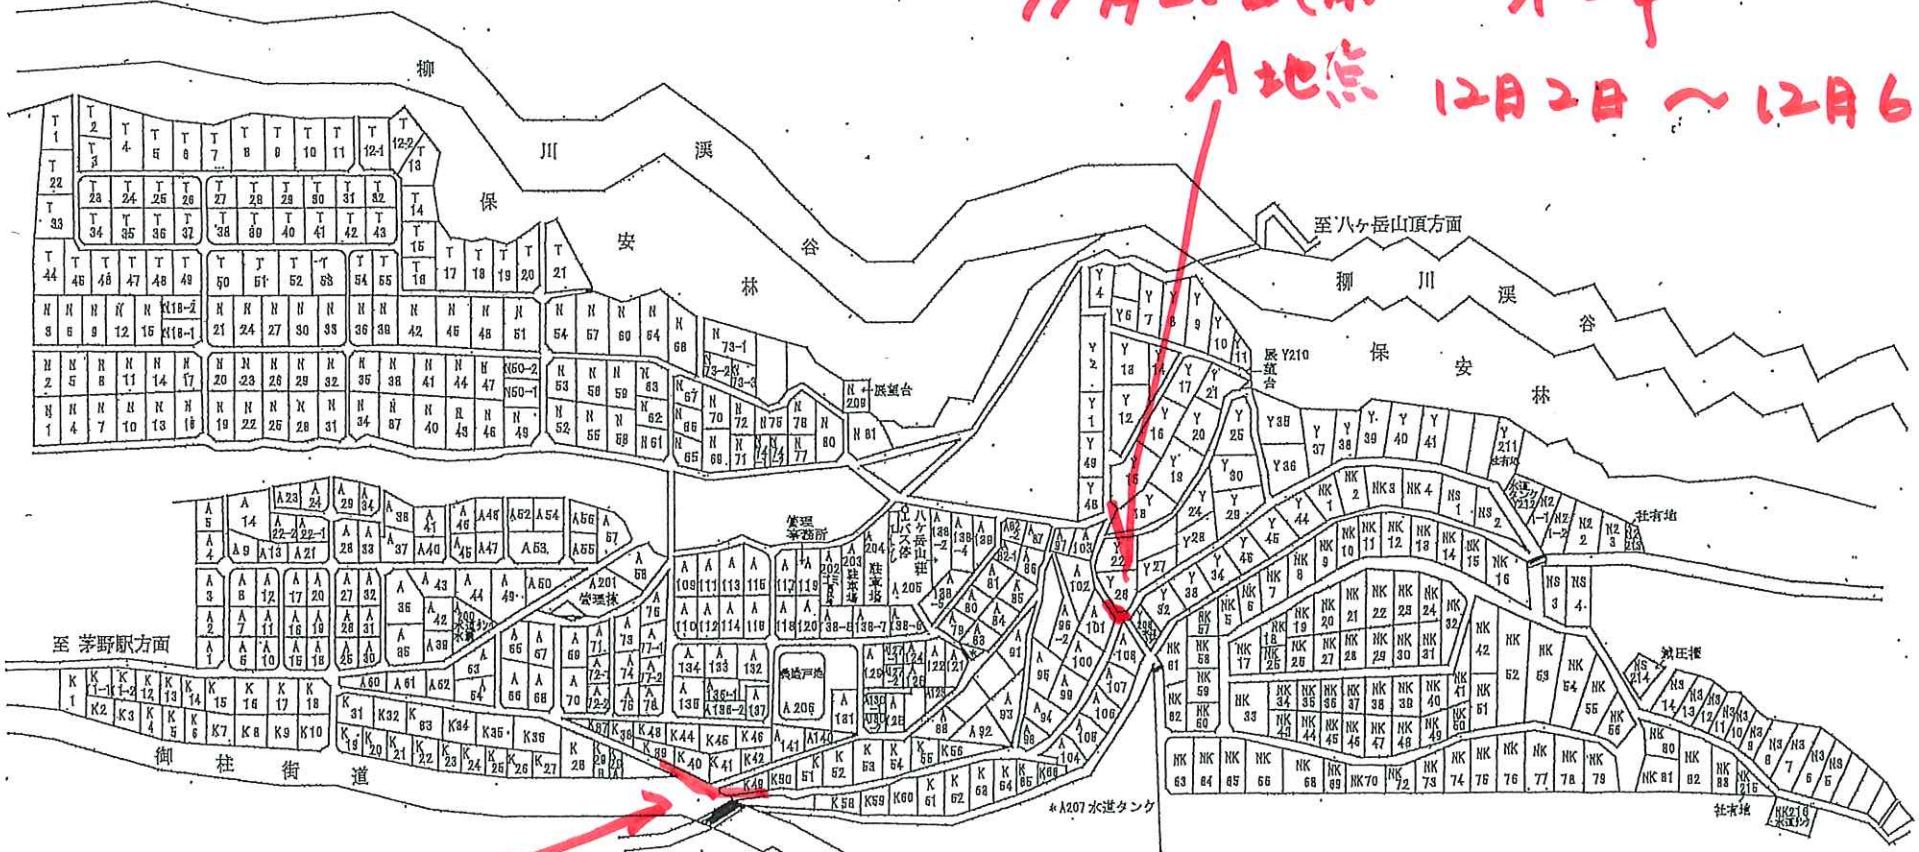

B地点 11月25日 ~ 11月29日

2024年11月

24年10月							24年12月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	13	14
13	14	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	27	28
27	28	29	30	31			29	30	31				

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24 休工	25 BH0.2×2台搬入 砂・碎石搬入	26 K地区掘削開始 ※資材搬入（管材）	27 K地区配水管布設	28 K地区配水管布設	29 既設管接続	30 休工
1 休工	2	メモ K地区は断水の計画はありませんが、進捗により道路規制箇所が変わっていきます。				

2024年12月

24年11月							25年1月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
					1	2				1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11
10	11	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	19	20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29	30	26	27	28	29	30	31	

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1 休工	2 第3水槽前配水管布設工 ①計画断水 AM9:00~PM5:00	3 第3水槽前配水管布設工 ①計画断水(予備日) AM9:00~PM5:00	4 第3水槽前配水管布設工 既設管接続 ②計画断水 AM9:00~PM5:00	5 第3水槽前配水管布設工 既設管接続 ②計画断水(予備日) AM9:00~PM5:00	6 第3水槽前配水管布設工	7 休工
8 休工	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	×E ①計画断水(断水エリア) Y1~23、48、49、102 A98~102 ②計画断水(断水エリア) A-104~106 NK61、62				
