

2025年4月

25年3月							25年5月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
						1					1	2	3
2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	12	13	14	15	11	12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21	22	18	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	29	25	26	27	28	29	30	31
30	31												

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
30	31	1	2	3	4	5
6	7 機械搬入 看板設置 土場整地 等	8	9	10 ※試験掘 (仮)	11	12
13	14 試験掘	15	16 仮設配管 給水管掘削・配管	17	18	19
20	21 仮設配管 給水管掘削・配管	22	23	24	25	26
27	28 予備日	29 休日	30 予備日	1	2 GW	3
4	5	×モ 4月は準備工及び仮設工を予定しています。 土日祝日は原則休工を予定しています。 ※10, 11日は水槽清掃業者と打ち合わせをし、工程調整をしたいと考えています。				


2025年5月

25年4月							25年6月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	8	9	10	11	12	13	14
13	14	15	16	17	18	19	15	16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	27	28
27	28	29	30				29	30					

日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
27	28	29	30	1	2 GW	3
4	5 GW	6	7 送配水管替え開始 (A区間からスタート)	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	メモ 5月7日～送配水管布設替えをスタートし、6月中旬頃に完成を予定しています。 ※土質により工程が変動する事が想定されますので、6月以降は追ってご連絡させていただきたいと考えています。				

令和7年度 水道施設大規模修繕工事 第1期工事 (8)

計画

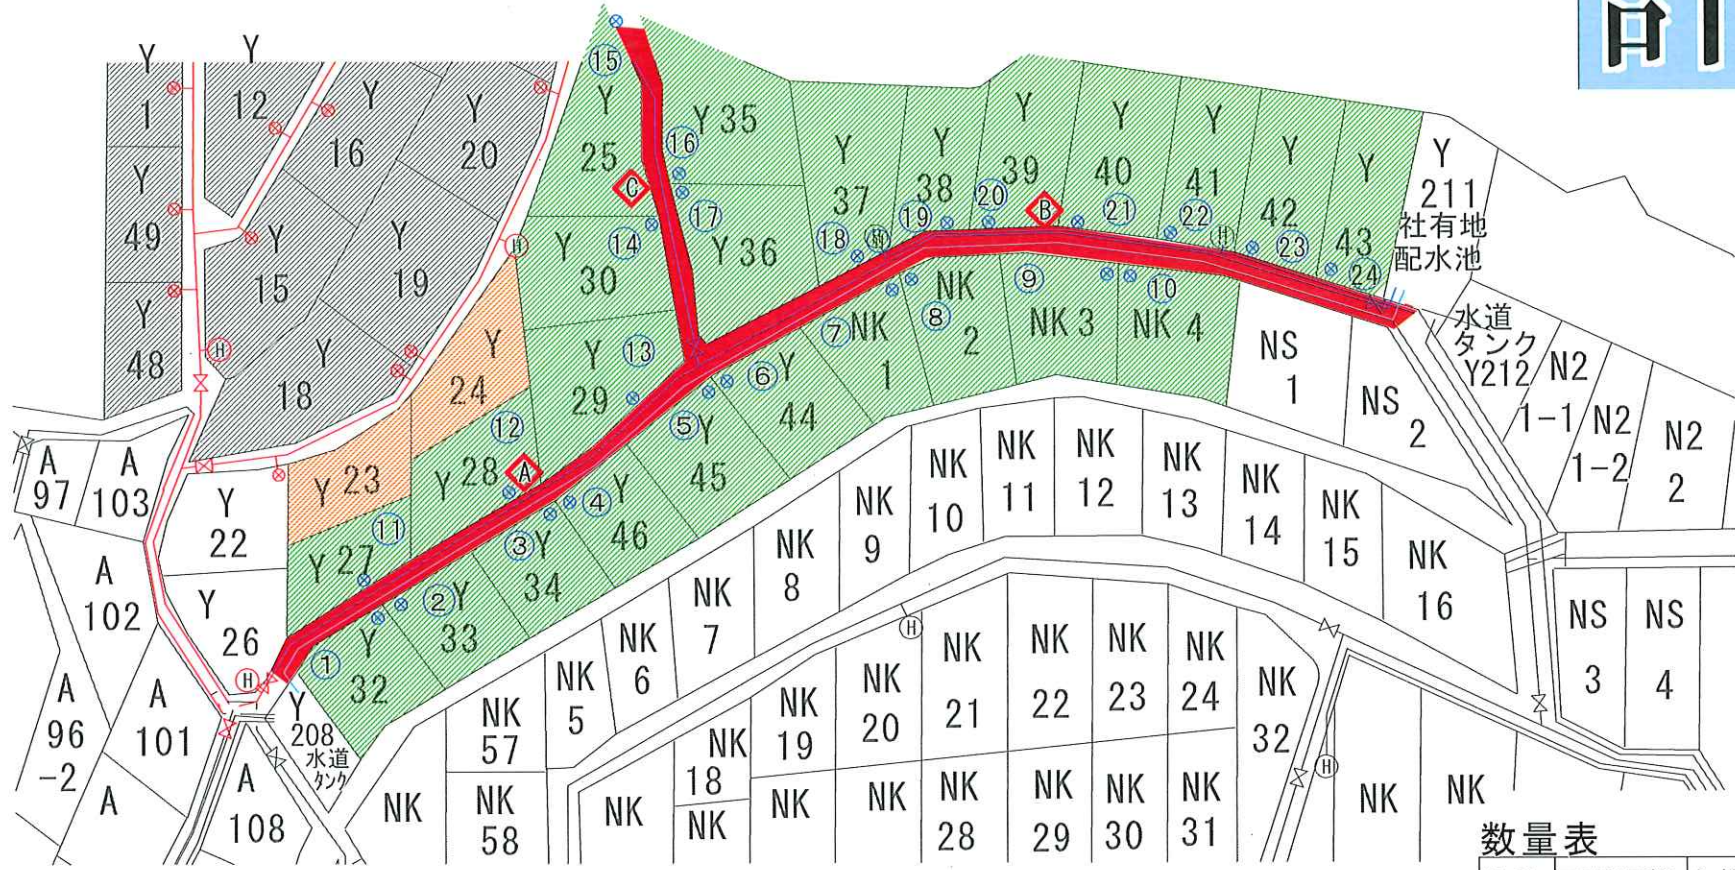

工事名 令和7年度 水道施設大規模修繕工事 第1期工事(8)
工期 令和
場所 美濃戸高原別荘地 Y・NK地区
工事概要
 配水管 654m 送水管 394m 仮設 1084m
 消火栓 3箇所 仕切弁 2箇所 給水管 24箇所

数量表

記号	区間距離	弁栓類設置数量
A	送水204m	給水管
	2条配管 配水204m	24件
B	送水190m	仕切弁
	3条配管 配水190m	2箇所
C	配水190m	消火栓
	配水70m	3箇所
送水合計	394m	※既設接続
配水合計	654m	

凡例

配水管 布設替区間	
配水管 既設予想線	
給水管 (布設替区画)	

配管計画図
